


Etat initial T0




T0 + 5 ans

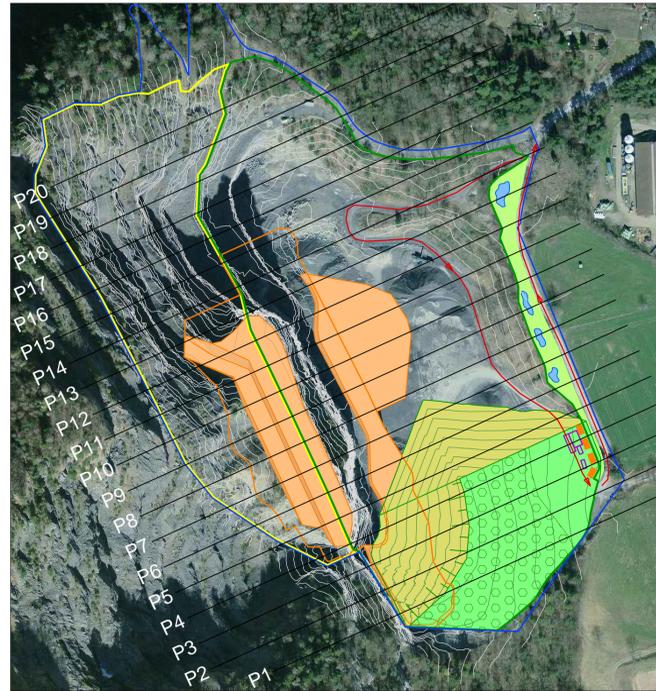

- **carrière (de T0 à T0+5)** : extraction de 350'330 m³ de matériaux (910'866 tonnes) de la barre de Malm inférieure et du sommet du promontoire rocheux ;
- **dépôt (de T0 à T0+5)** : 357'333 m³ de matériaux mis en place sur la partie sud ;
- **mesures d'intégration et de remplacement** : aménagement nature de la bordure est du dépôt et pose des nichoirs

T0 + 10 ans

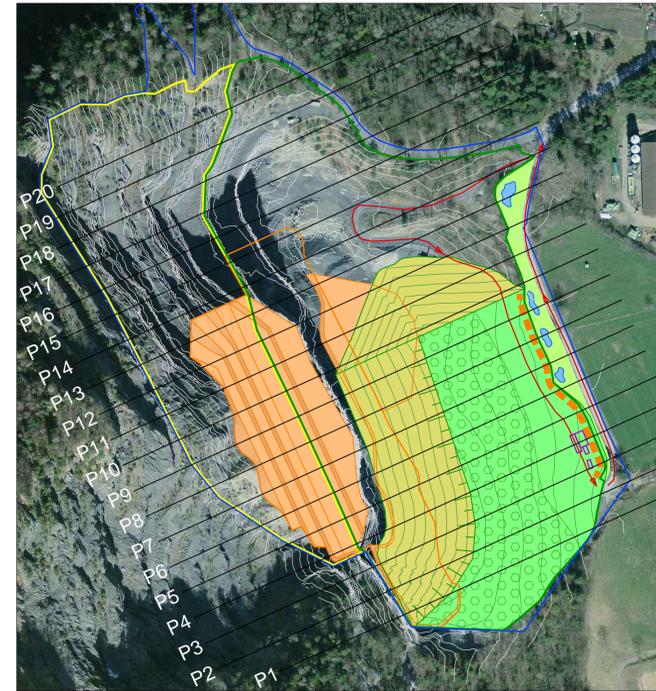


- **carrière (de T0+5 à T0+10)** : extraction de 700'667 m³ de matériaux (1'821'733 tonnes au total) : l'extraction du promontoire rocheux s'est poursuivie du haut vers le bas ;
- **dépôt (de T0+5 à T0+10)** : total de 714'667 m³ de matériaux mis en place depuis le sud; le pied de la falaise n'est pas rempli ;
- **remise en état, mesures d'intégration et de remplacement** : aménagement nature de la partie sud-est du talus du dépôt, intégration de la partie sommitale des falaises dans le paysage (minages paysagers), évacuation de tous les déchets datant de l'exploitation antérieure et aménagement de la mare sur la rive gauche de St-Barthélemy

Légende

- Périètre du PAD
- Secteur d'extraction
- Secteur de dépôt de matériaux
- Secteur de minages paysagers et de sécurisation
- Installations de chantier
- Piste d'accès
- Digue de protection (principe)
- Terrain naturel
- Secteur excavé
- Secteur avec remblayage en cours
- Secteur remblayé avec aménagements de surface terminés
- Aménagements nature
- Aire forestière

T0 + 15 ans

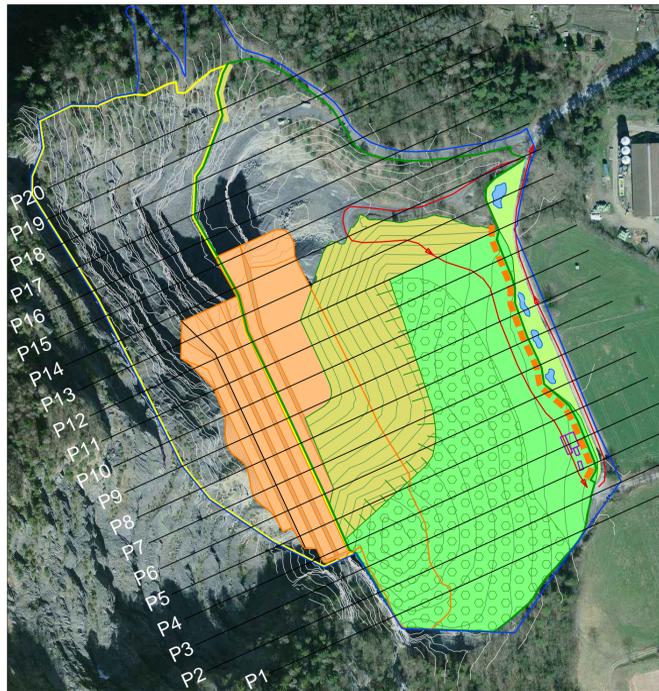

- **carrière (de T0+10 à T0+15)** : extraction de 1'051'000 m³ de matériaux (2'732'600 tonnes au total) : le promontoire est totalement excavé; l'extraction est terminée;
- **dépôt (de T0+10 à T0+15)** : total de 1'072'000 m³ de matériaux mis en place depuis le sud en direction du nord ; le pied de la falaise n'est pas rempli ;
- **remise en état, mesures d'intégration et de remplacement** : les parties sud-est et est du talus du dépôt sont renaturées (boisement de compensation terminé), et la falaise est intégrée dans le paysage (minages paysagers terminés).

T0 + 20 ans



- **dépôt (de T0+15 à T0+20)** : remblayage d'un total de 1'429'333 m³ : le dépôt occupe l'entier de la surface et le remplissage au pied de la falaise a démarré; un accès sur la partie nord du dépôt est conservé pour accéder au pied de la falaise et finaliser la partie nord ;
- **remise en état, mesures d'intégration et de remplacement** : la partie nord-est du talus du dépôt est renaturée.

T0 + 30 ans



- **dépôt (de T0+20 à T0+30)** : remblayage de 2'144'000 m³ au total : le remplissage du dépôt est terminé ;
- **remise en état, mesures d'intégration et de remplacement** : le solde des talus du dépôt sont renaturés et les aménagements nature finalisés au pied de la falaise, dans le piège à blocs.

Canton du Valais
Municipalité de Saint-Maurice



Modification partielle du Plan d'affectation des zones (PAZ) et du Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et Plan d'aménagement détaillé (PAD)

Mise en conformité de la carrière des Râpes

Etapas d'excavation et de remblayage : Localisation des coupes 1:2'500
